

# StabiLU

*Regionalkonferenz für  
Schulleitende*

*12. März 2025*

*Verkehrshaus Luzern*



# StabiLU – das Projekt

- Umfasst die Beschaffung, die Umsetzung und den Betrieb einer Schuladministrationssoftware bei sämtlichen Luzerner Volksschulen, um diesen eine zeitgemässe und den Ansprüchen entsprechende Schuladministrationssoftware zur Verfügung zu stellen.
- VLG unterstützt und nimmt aktive Rolle wahr.
- Schuladministrationsmitarbeitende und Schulleitungsmitglieder, Vertreterinnen und Vertreter von Musikschulen und Tagesstrukturen wurden in die Evaluation einbezogen und sind auch in der Projektorganisation vertreten.
- Die Erfahrungen aus dem vorangegangenen Projekt wurden ermittelt und analysiert und flossen in das neue Projekt ein.


# Beschaffungsgegenstand

Eine zukunftsorientierte Schuladministrationssoftware deckt ab:

- Kernprozesse der Volksschulen
- inkl. Tagesstrukturen, Prozesse der Musikschulen, der Sonderschulen und der Schuldienste
- Betrieb / Support durch Anbieterin

# Übersicht der CMI Lösungsplattform

# Für StabiLU relevante Fachlösungen / Module

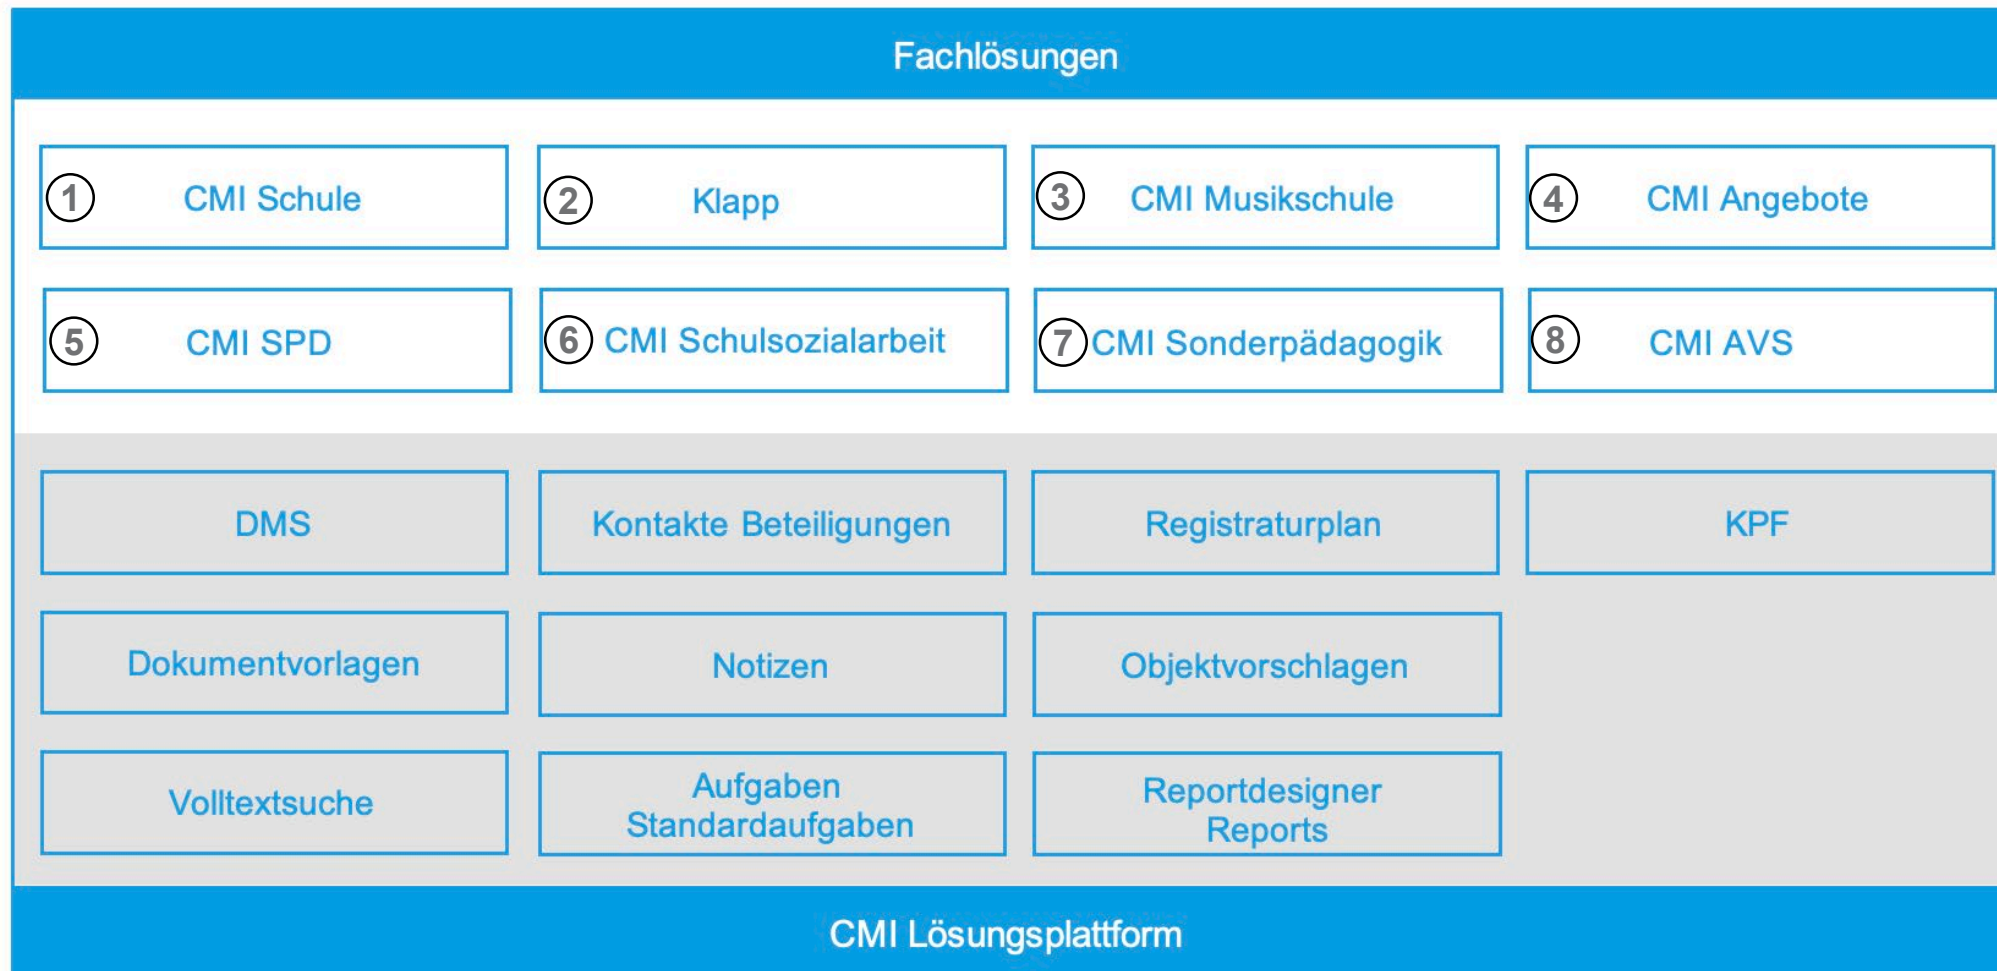

# Qualitätssicherung und Riskmanagement

- Adäquate Qualitätssicherungsmaßnahmen werden implementiert, überwacht, eingefordert und umgesetzt via PL / externer QRM
- Es wird ein Projekt-Riskmanagement geführt mit Risiken und entsprechenden Massnahmen. Dieses wird periodisch überprüft und der Situation angepasst und gemeinsam mit CMI geführt



## Projekt StabiLU – Kurzinfor für Regionalkonferenz, 12. März 2025

Das Projekt umfasst die **Beschaffung**, die **Umsetzung** und den **Betrieb** einer Schuladministrationssoftware bei sämtlichen Luzerner Volksschulen, um diesen eine zeitgemässe und den Ansprüchen entsprechende Schuladministrationssoftware zur Verfügung zu stellen.

### Beschaffungsgegenstand


CMI Schule, eine zukunftsorientierte Schuladministrationssoftware deckt ab:

- **Kernprozesse** der **Volksschulen**
- Inkl. **Tagesstrukturen**, Prozesse der **Musikschulen**, der **Sonderschulen** und der **Schuldienste**

### Projektstand März 2025

- ✓ Gesamt: Projektstart geglückt, Initialisierung abgeschlossen, Konzepte in Arbeit
- ✓ Termine: auf Kurs nach Neuplanung (Verzögerung einzelner Module, z.B. Musikschule)
- ✓ Kosten: Kostendach gemäss Sonderkredit Kantonsrat Juni 20024
- ✓ Ergebnisse: in Arbeit, erste Workshops starten ab dieser Woche
- ✓ Aufwand: hohe Komplexität, viele Themen hängen zusammen
- ✓ Qualität: Themen werden unter diversen Aspekten mit verschiedenen Stakeholdern diskutiert und ausgelotet

### Projektplan

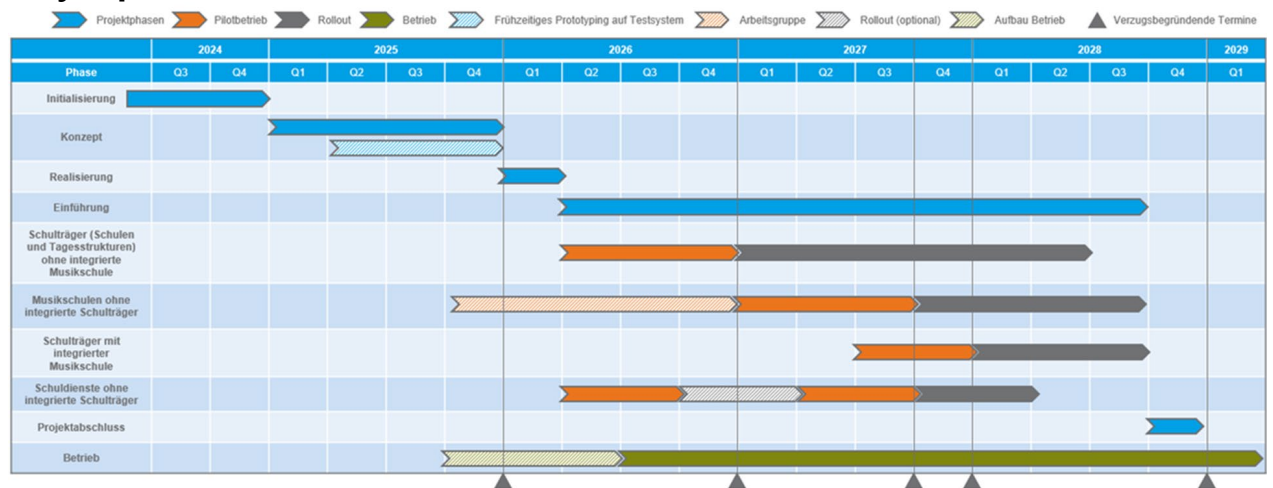

Konzeptphase 2025 / Pilotphase 2026 – 2027 / Rollout ab 2027

### Pilotschulen

Ermensee, Hitzkirch, Buchrain, Stadt Luzern, HPZ Hohenrain
