

StabiLU – Regionalkonferenz

11. März 2026, 14.00 Uhr

Zoom



Agenda

- Aktueller Stand Projekt StabiLU
 - Finalisierung Konzepte
 - Einrichten R26 mit Migrationsdaten / Schulung Kernteam
 - Angepasste Planung



Projektstand

- Konzeptphase beendet
 - Konzepte abgenommen
 - Keine offenen Punkte für Pilotphase
 - Freigabe Steuerung am 27.2.26 **Realisierungsphase**
- Erarbeitung Prototyp auf CMI Schule Release 26
 - Regelschulen / Tagesstrukturen für Hitzkirch und Ermensee
 - Migration mit produktiven Daten
 - Anbindung Schnittstellen (LuReg, LehrerOffice, etc.)
- Angepasste und freigegebene Planung – abgestimmt mit Pilotschulen
 - Leichte Verschiebung auf der Zeitachse
 - Weiterhin per Ende 2028 alle Installationen abgeschlossen

Betriebskonzept

- Betriebskonzept ist sehr weit fortgeschritten
- Im Betriebskonzept gibt es offene Punkte zur Klärung für den VLG (organisatorische / finanzielle Themen)
 - VLG klärt Vorgehen bis Ende März 2026
- Fragen mit Controlling BKDDS/DVS sind in Klärung für Budgetierung, konkrete Informationen folgen im Juni dazu.

Prototyp / eingerichtetes Testsystem Realisierungsphase

- Erfahrungen mit parametrimtem Testsystem im Kernteam
- Einrichten aller Schnittstellen
- Iteratives Testen ab April 2026
- Das Kernteam, ergänzt durch 2 Kolleginnen der Stadt Luzern, werden die Tests mit den vorhandenen Funktionalitäten durchführen und die Resultate mit den Pilotschulen spiegeln
- Per Ende Juni 26 steht der vollständige Prototyp zur Verfügung, letzte Tests im Juli/August, Onboarding Piloten für produktiven Start (detaillierte Abstimmung mit Piloten separat).

Angepasste Planung

- Hintergründe
- Planungsvorschlag
- Auswirkungen / Risiken / Konsequenzen

- Dient zur Betriebserprobung der Prozesse
- Kernprozesse gemäss definierten Use-Cases können abgebildet werden
- Definierte Rollen, Zuständigkeiten und organisatorische Abläufe (Prozesse) sind im Schulbetrieb verständlich und umsetzbar
- Migration der Daten ist fachlich korrekt und vollständig
- Der Betrieb ist sichergestellt und die Support-Prozesse funktionieren
- Die Pilotanwender werden geschult und sind nachher in der Lage, ihre Aufgaben selbstständig und korrekt zu erledigen
- Die Lösung wird von den Pilotanwendern akzeptiert und als Unterstützung wahrgenommen

Abgrenzung

Die Pilotphase...

- ...dient nicht als funktionale Abnahme
- ...dient nicht der vollständigen Prozessoptimierung
- ...ersetzt keine funktionalen Tests und stellt kein Rollout dar

Voraussetzung für eine erfolgreiche Pilotierung


Jahr 2026 im Q3 Start Pilotphase

- Release 26 ist voll funktionsfähig und von der CMI getestet und freigegeben.
- Release 26 ist auf Testsystem installiert und funktionsfähig (Schnittstellen, migrierten produktiven Daten der Pilotschulen)
- Kernteam und Pilot-User ist geschult
- Use-Cases konnten mit Release 26 abgebildet werden und sind somit abgedeckt

Jahr 2027+ (Rollout Regelschulen & Tagesstrukturen, Piloten Musikschulen, SPD, SSA)

- CMI kann gemäss Planung die notwendigen Softwaremodule liefern
- Funktionen für Rollout Regelschulen und Tagesstrukturen vorhanden
- Funktionen für Pilotierung Musikschulen, SPD, SSA vorhanden

Grobplanung StabiLU – Stand März 2026

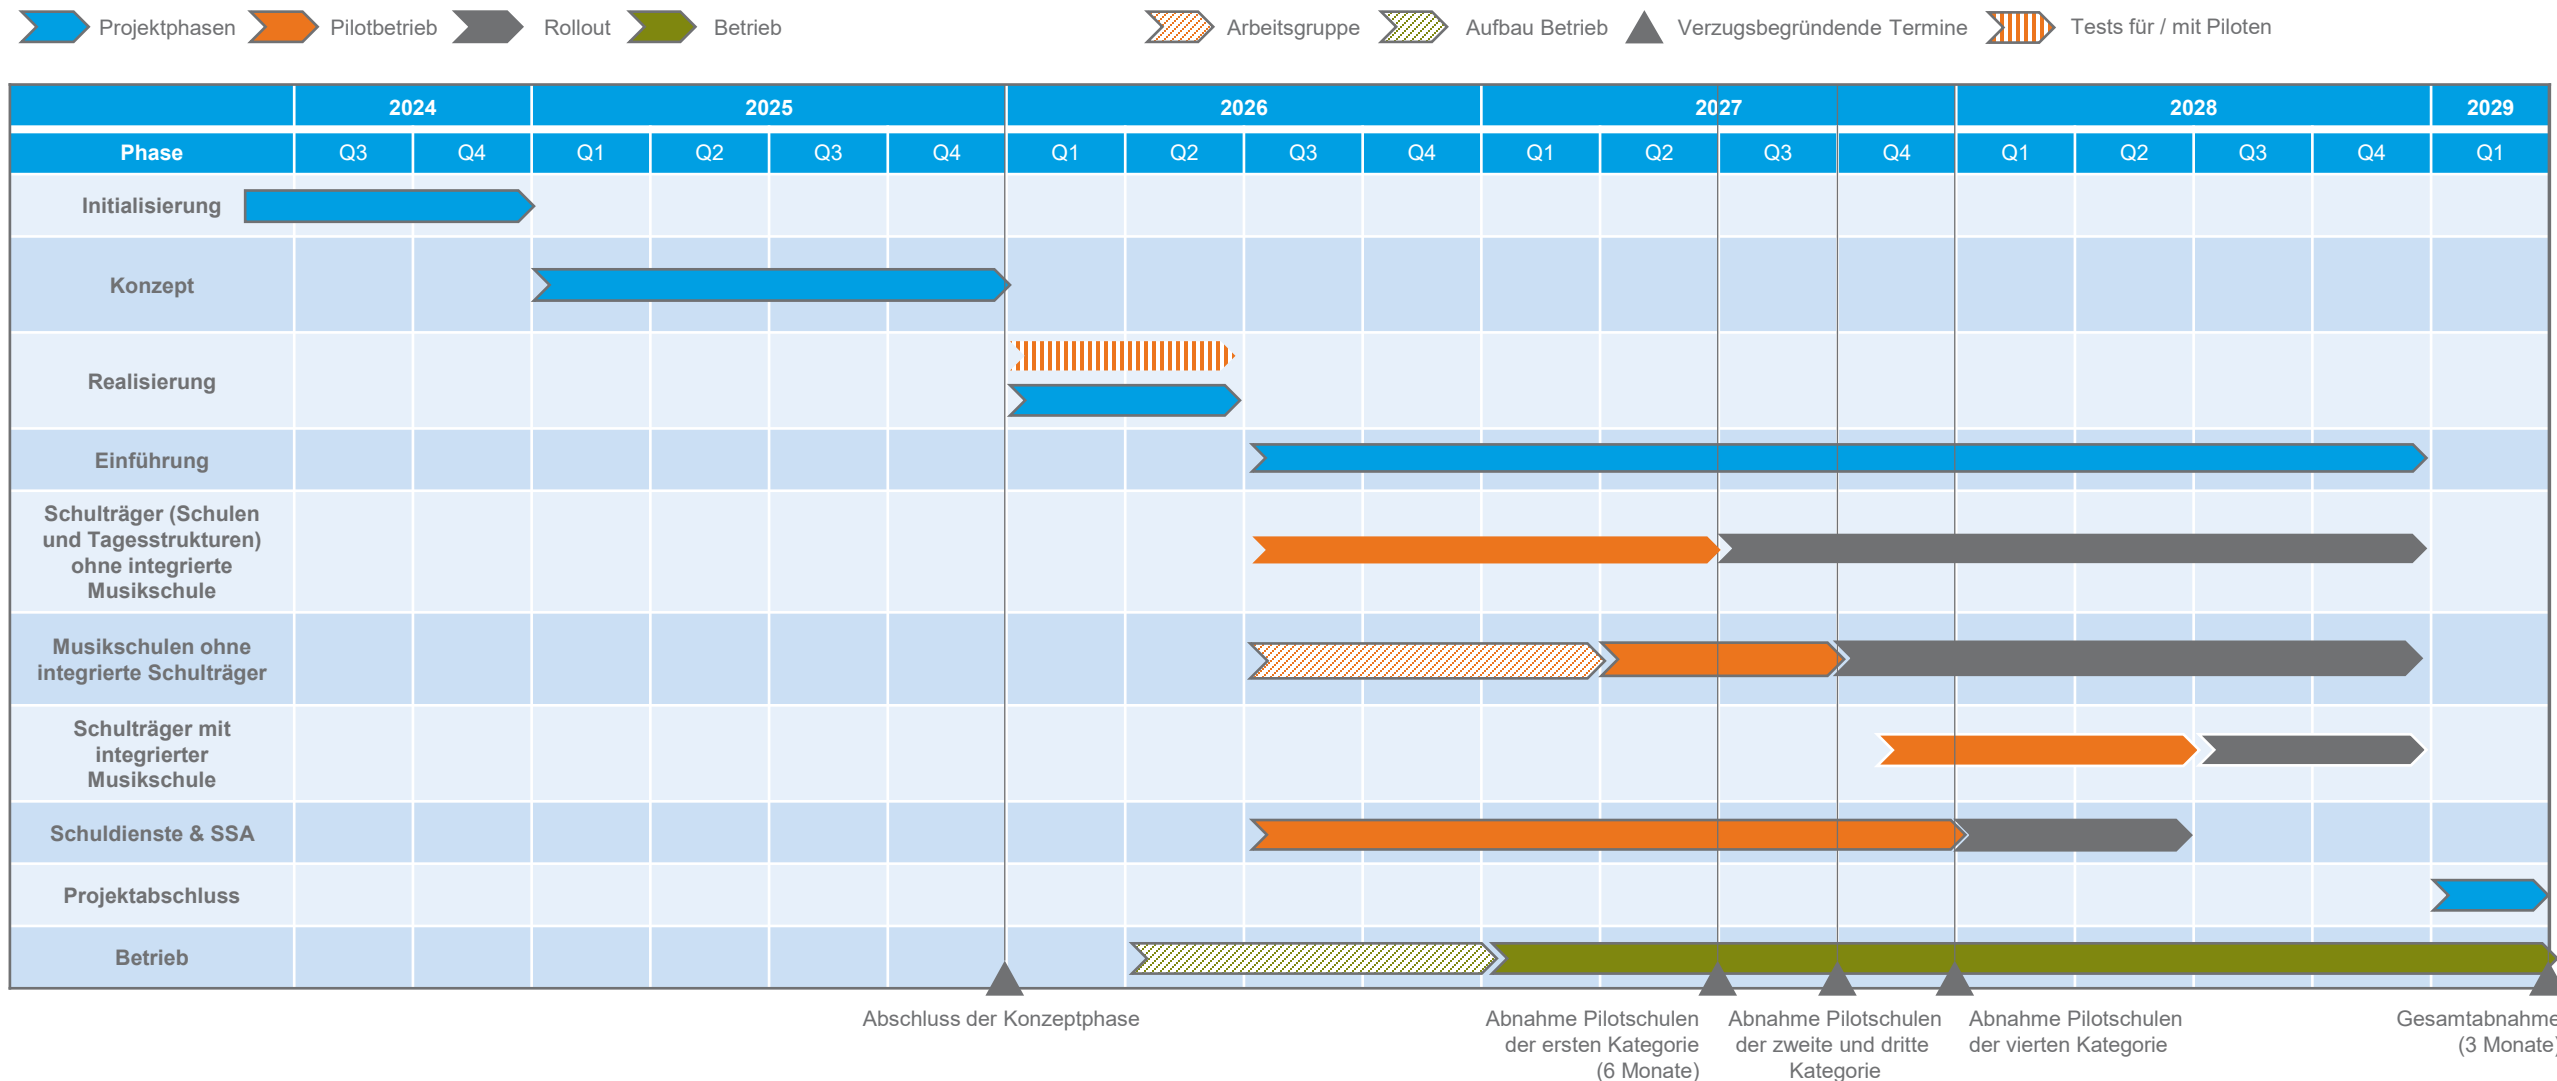


Hintergründe der angepassten Planung

- Grund für die Neuplanung: Phase Konzeption hat mehr Zeit beansprucht als angenommen; es liegt eine solide Grundlage für die kommende Phase vor
- Verschiebung Start Pilotphase Regelschulen ohne integrierte Musikschulen um ein Quartal mit gleichzeitiger Verlängerung der Pilotphase um ein Quartal
- Die angepasste Planung ist mit den Pilotschulen abgestimmt
- Damit verschieben sich die Rollout-Phasen entsprechend um zwei Quartale, jedoch der Abschluss des Gesamtprojekts lediglich um drei Monate; es bleibt bei einer Einführung per 2028.
- Durch diese marginale Verschiebung kann die Qualität der Einführung erhöht werden und somit Sicherheit für das Projekt und vor allem die Nutzenden geschaffen werden



Bildung: Modulübersicht R27 (verfügbar ab 01.04.2027)

Musikschule, SSA, SPD, Erweiterungen, Optimierungen, ...

- Basismodul
- Erweiterungen Basismodul
- Fokus Schulverwaltung
- Fokus Unterricht
- Weitere Bildungsmodule
- Weitere relevante CMI-Module

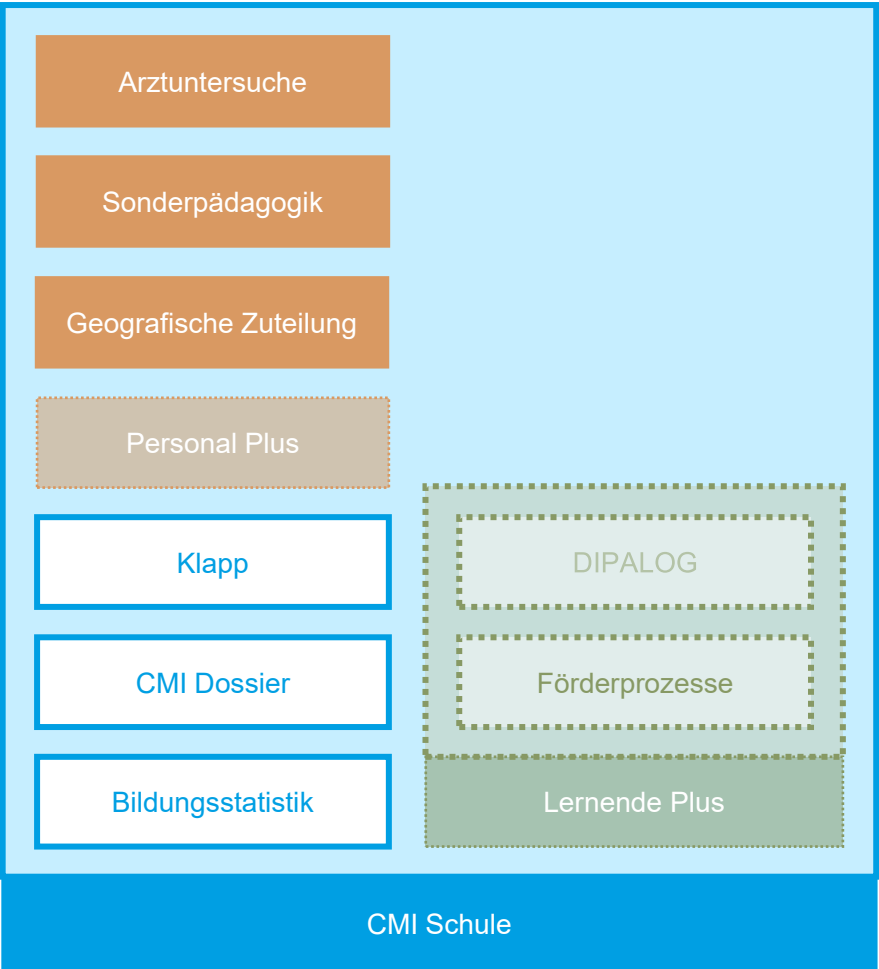

← abgestimmt

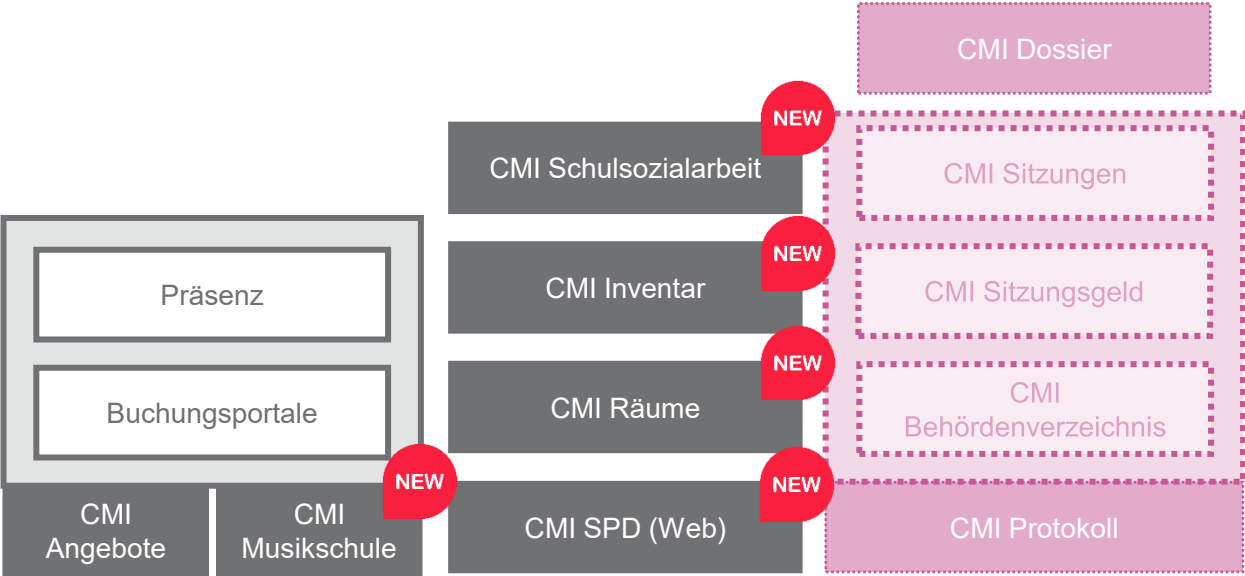

Detailplanung – Rollout I

	Gruppen (Regelschule)	Regelschule	Tagesstrukturen	SSA	Schuldienste (jeweiliger SD Kreis)	Musikschulen (jeweiliger Kreis)
Buchrain	Pilot	SJ 2026/2027	SJ 2026/2027	KW 16 (2027)		
Ermensee		SJ 2026/2027	SJ 2026/2027	KW 16 (2027)	KW 42 (2026) SD Hochdorf / DVS FD	
Hitzkirch		SJ 2026/2027	SJ 2026/2027	KW 16 (2027)	KW 42 (2026) SD Hochdorf / DVS FD	KW 42 (2027)
Luzern		Q4 - 2027 / Q1 - 2028 provisorisch - noch nicht final abgestimmt				
SD Hochdorf					KW 42 (2026)	
DVS FD					KW 42 (2026)	
DVS Zentrale Dienste		SJ 2026/2027				
HPZH		SJ 2026/2027	SJ 2026/2027	KW 16 (2027)		

Detailplanung – Rollout I

	Gruppen (Regelschule)	Regelschule	Tagesstrukturen	SSA	Schuldienste (jeweiliger SD Kreis)	Musikschulen (jeweiliger Kreis)
Gruppe 1	Ebikon , <i>Buchrain</i> , Root, Dierikon, Gisikon	KW 30 (2027)	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q3 - 2028
Gruppe 2	Eschenbach , <i>Hitzkirch</i> , <i>Ermensee</i> , Inwil, Ballwil	KW 32 (2027)	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q3 - 2028
Gruppe 3	Hochdorf , Hohenrain, Römerswil, Aesch, Schongau	KW 34 (2027)	Q1 - 2028	Q2 - 2028		Q3 - 2028
Gruppe 4	Sursee , Oberkirch, Nottwil, Schenkon	KW 35 (2027)	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q3 - 2028
Gruppe 5	Geuensee , Knutwil, Mauensee	KW 36 (2027)	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q3 - 2028
Gruppe 6	Beromünster , Triengen, Rickenbach, Büron, Schlierbach	KW 37 (2027)	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q3 - 2028
Gruppe 7	Neuenkirch , Sempach, Eich	KW 38 (2027)	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q3 - 2028
Gruppe 8	Rothenburg , Rain, Hildisrieden	KW 41 (2027)	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q3 - 2028
Gruppe 9	Dagmersellen , Pfaffnau, Roggliwil	KW 43 (2027)	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q3 - 2028
Gruppe 10	Reiden , Nebikon, Altishofen, Wikon	KW 45 (2027)	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q4 - 2028
Gruppe 11	Schötz , Wauwil, Egolzwil	KW 47 (2027)	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q4 - 2028

Detailplanung – Rollout I


	Gruppen (Regelschule)	Regelschule	Tagesstrukturen	SSA	Schuldienste (jeweiliger SD Kreis)	Musikschulen (jeweiliger Kreis)
Gruppe 12	Malters , Werthenstein, Schwarzenberg	KW 48 (2027)	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q4 - 2028
Gruppe 13	Zell , Altbüren, Grossdietwil, Ufhusen, Fischbach	Q1 2028	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q4 - 2028
Gruppe 14	Ettiswil , Alberswil	Q1 2028	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q4 - 2028
Gruppe 15	Willisau , Menznau, Hergiswil, Luthern	Q1 2028	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q4 - 2028
Gruppe 16	Wolhusen , Entlebuch, Hasle, Doppleschwand, Romoos	Q1 2028	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q4 - 2028
Gruppe 17	Escholz matt-Marbach , Schüpfheim, Flühli-Sörenberg	Q1 2028	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q4 - 2028
Gruppe 18	Ruswil , Grosswangen, Buttisholz	Q1 2028	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q4 - 2028
Gruppe 19	Weggis , Vitznau, Greppen	Q1 2028	Q1 - 2028	Q2 - 2028	Q3 - 2028	Q4 - 2028
Gruppe 20	Adligenswil , Udligenswil, Meierskappel	Q1 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q3 - 2028	Q4 - 2028
Gruppe 21	Emmen	Q2 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028
Gruppe 22	Kriens	Q2 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028

Detailplanung – Rollout I

	Gruppen (Regelschule)	Regelschule	Tagesstrukturen	SSA	Schuldienste (jeweiliger SD Kreis)	Musikschulen (jeweiliger Kreis)
Gruppe 23	Horw	Q2 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028
Gruppe 24	Meggen	Q2 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028
Gruppe 25	HPS Luzern, HPS Sursee, HPS Wilisau, HPZ Schüpfheim	Q2 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028
Gruppe 26	SSA Schulungsangebot Asyl	Q2 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028	Q2 - 2028

grau: Planung provisorisch - 11.03.2026

Einführung auf der Zeitschiene (zur Erinnerung)

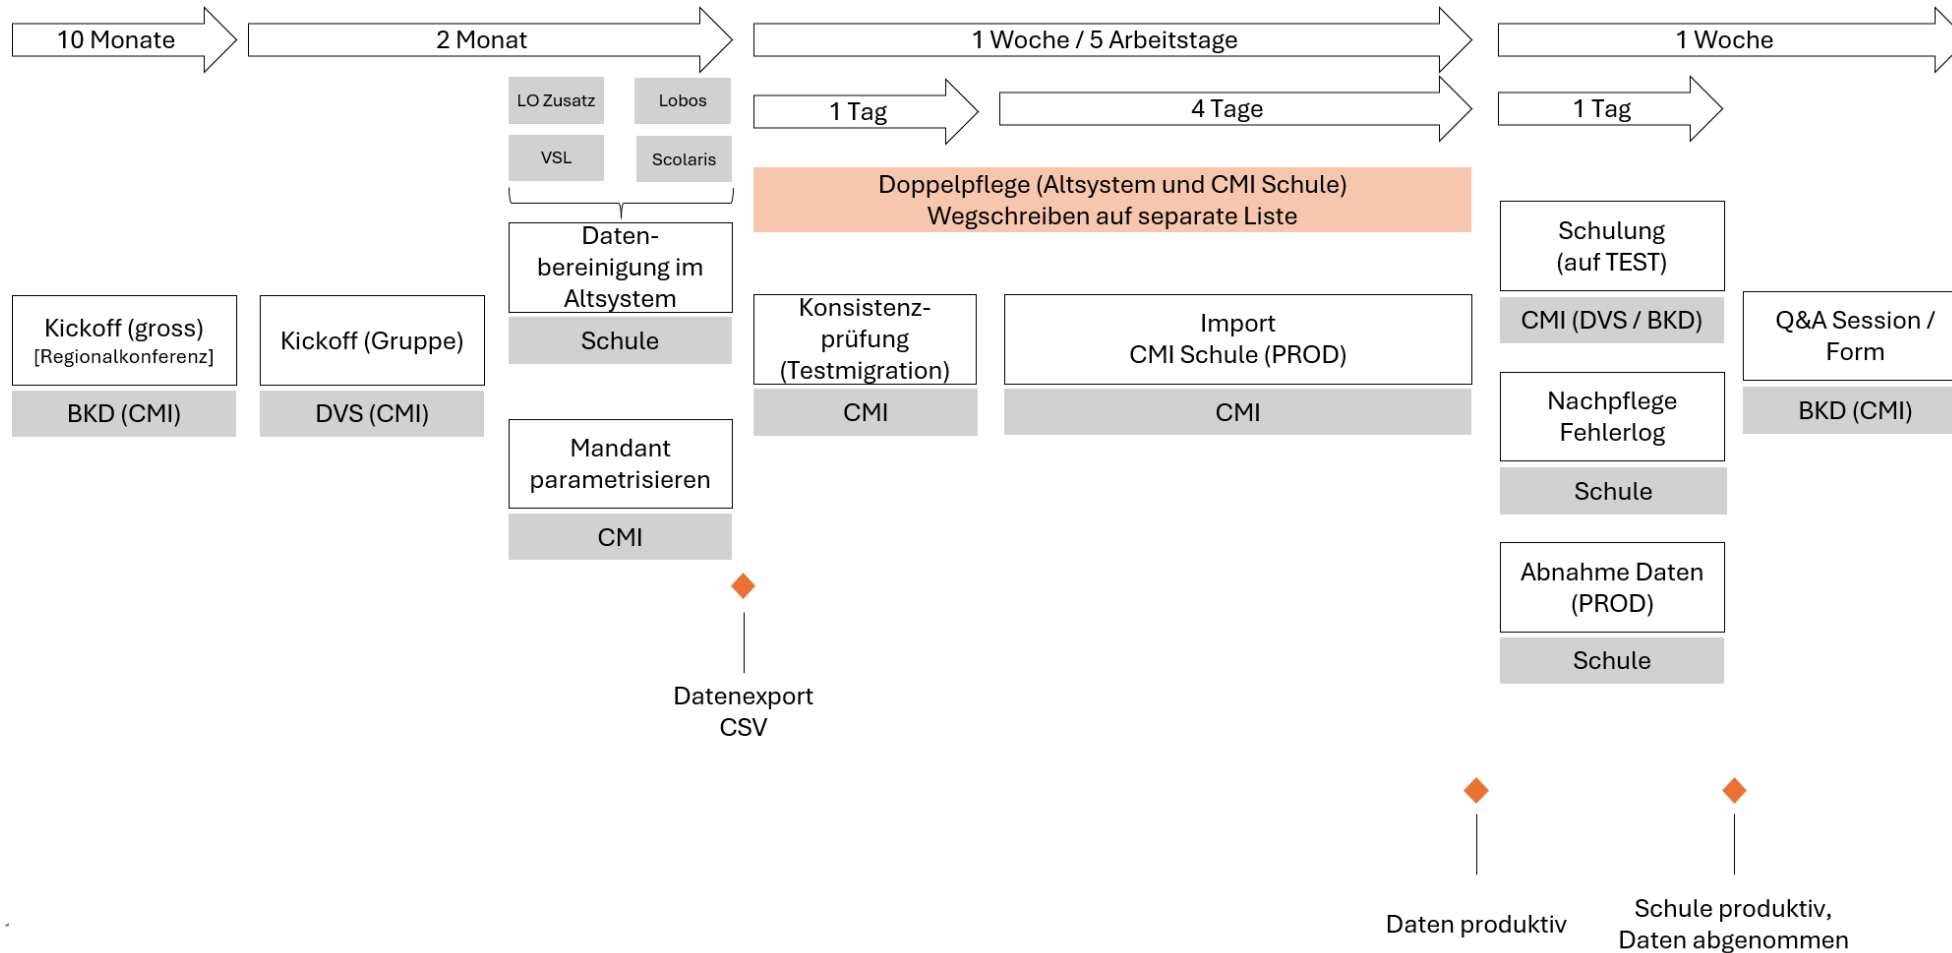

Rahmenbedingungen gemäss Einführungskonzept

	<u>Mandatenkategorie</u>	Q1	Q2	Q3	Q4	Bemerkungen / Hintergründe
1	Regelschulen / SSA					- Jederzeit, auch während den Sommerferien - Solaris Schulen im Dezember/Januar einplanen (aufgrund Ressourcenverfügbarkeit seitens Schule)
1	Sonderschulen					
1	Tagesstrukturen					- Angebote und Anmeldungen erfolgen im 1. Halbjahr. Ein laufendes Schuljahr umzustellen ist nicht zumutbar. - Grössere Schulen im Q1 einplanen
2 / (3)	Musikschulen					
4	Schuldienste (SD) <u>DVS Fachdienst</u> (Audio / Video)					Nicht November - Januar
5	DVS Zentrale Dienste					Nicht im August / September

Mit Schulen abgestimmt

- Austausch mit Präsident VML – folgendes vorgesehen:
 - PL am 24. März 26 Musikschulleitende-Konferenz, kurzer Input Roadmap / Workshops / Kommunikation
- CMI plant eine Arbeitsgruppe mit Endkunden für CMI Musikschule zu bilden
 - Luzern kann mit 2 Vertretenden in der AG teilnehmen
- Die AG wird auch Vertreter anderer Kantone enthalten
- Die Arbeitsgruppe hat Sicht Produktentwicklung und nicht Projekt StabiLU
 - Hierzu sind zusätzliche Massnahmen geplant (StabiLU – CMI Musikschulen)

Varia / Fragen / Diskussion



Bildungs- und Kulturdepartement

BKD-DS, PID

Bahnhofstrasse 18

6002 Luzern

Telefon 041 228 78 13

URL www.bkd.lu.ch

E-Mail andreas.capiaghi@lu.ch
